

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO LICITANTE

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2023

ILMA SRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, vem respeitosamente à presença de V.Sa., em resposta à solicitação contida na ata de abertura de envelopes, prestar os seguintes

ESCLARECIMENTOS

A empresa JCosta cumpre o requisito exigido no item 6.1.4.6, subitem 9.6 do edital, pois, além de já ter apresentado CAT desse requisito, também apresenta como comprovação da sua capacidade técnico-operacional, documentos oriundos do **contrato 88/2023, pregão eletrônico 12/2023**, onde a empresa **executou** obra com característica semelhante ao objeto da presente licitação, para o próprio município de Pouso Alegre.

Durante o mês de agosto de 2023, a empresa J Costa Engenharia e Construção LTDA, executou a obra de manutenção no telhado do Departamento de Limpeza.

A manutenção compreendeu serviços de troca de peças de madeira, caibros, ripas e telhas cerâmicas. A área do telhado do local da manutenção é de **469 m²**, conforme Anexo 1.

As fotos do telhado ainda aberto para troca de madeiramento estão no Anexo 1.

Também em anexo a foto do telhado inteiramente reformado.

Em anexo, também se encontram o diário de obras do mês de agosto/2023 e a **ordem de serviço nº 39** emitida pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços desse Município, assinada pelo secretário Augusto Hart Pereira, permitindo a manutenção do telhado do departamento de limpeza.

Abaixo seguem algumas fotos mostrando o departamento de limpeza e as áreas onde o telhado é cerâmico.



Figura 1: parte do depósito e políticas sociais no departamento de limpeza



Figura 2: Portão do Departamento de Limpeza



Figura 3: Depósito e fiscalização



Figura 4: Almoxarifado

Por todo exposto, diante da documentação ora apresentada, aliada à CAT, restou provado que a empresa JCosta preenche o requisito exigido no edital, requerendo seja declarada sua habilitação presente certame.

Santa Rita do Sapucaí, 13 de dezembro de 2023.

NATALIA SILVA
COSTA:089409
44674

Assinado digitalmente por NATALIA SILVA
COSTA:08940944674
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=21545437000180, OU=presencial, CN=
NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.13 17:03:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

JCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

ANEXO 1



Figura 1: Manutenção em peças de madeira no telhado do departamento de limpeza



Figura 2: Manutenção em peças de madeira no telhado do departamento de limpeza

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 01/08/2023								Condições do Tempo				Prazo contratual (meses):	
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação	
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x			Dias restantes	Dias de atraso
	X						Outros						
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	NO MERCADO MUNICIPAL, CONTINUA A INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO BANHEIRO MASCULINO, ONDE ESTÁ SENDO INSTALADA 3 VÁLVULAS HIDRAS PARA OS SANITÁRIOS, FISCAL NA OBRA.												
	NA PRAÇA DOS ESPORTES, CONTINUA OS REPAROS DAS 2 PISCINAS, ONDE SERÁ SUBSTITUIDO OS REVESTIMENTOS QUE ESTÃO DANIFICADOS E TAMBÉM A MANUTENÇÃO NA JUNTA DE DILATAÇÃO.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, HOJE INICIAMOS A COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS NO 1º PAVIMENTO.												
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, ESTAMOS FAZENDO OS REPAROS NO REBOCOS E CALÇADAS QUE ESTÃO DANIFICADOS, ESTAMOS CONTINUANDO A PINTURA EXTERNA DO LOCA. E TAMBÉM FAZENDO REPAROS NA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA, FISCAL VISITOU A OBRA.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 02/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva			Dias restantes			
		X					Outros			Dias de atraso			
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	NO MERCADO MUNICIPAL, HOJE FINALIZAMOS A INSTALAÇÃO DA VÁLVULA HYDRA NOS BANHEIROS MASCULINOS, ONDE RESTA APENAS A COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO 10X10 BRANCO.												
	NA PRAÇA DOS ESPORTES, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS PISCINAS, ESTAMOS REMOVENDO O REVESTIMENTO DANIFICADO E PREPARANDO PARA A INSTALAÇÃO DOS NOVOS REVESTIMENTOS.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ESTAMOS CONTINUANDO A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS NO SEGUNDO PAVIMENTO E TAMBÉM FAZENDO REPAROS NO REBOCO INTERNO DAS SALAS, QUE ESTÃO SOLTANDO E É NECESSÁRIO A REMOÇÃO E ASSIM FEITO O REPARO COM ARGAMASSA, FISCAL ESTEVE NA OBRA.												
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E TAMBÉM REPARO NA REDE ELÉTRICA. INICIAMOS TAMBÉM A MANUTENÇÃO NO TELHADO DA COZINHA E TAMBÉM DO BANHEIRO, ONDE É NECESSÁRIO A TROCA DE ALGUMAS TELHAS E A REINSTALAÇÃO DE ALGUMAS TELHAS QUE ESTÃO MAL COLOCADAS, FISCAL ESTEVE NA OBRA.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização

NATALIA
SILVA
COSTA:08940
944674

Assinado digitalmente por NATALIA
SILVA COSTA:08940944674
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU
=215437000180, OU=presencial, CN=
NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.12 09:14:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/09/2023 14:23 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/tp64f4.cff797c4>



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

Data: 03/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação	Dias restantes	Dias de atraso
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva						
			X				Outros						
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	NA PREFEITURA, HOJE ESTAMOS FAZENDO A LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DO TELHADO E TAMBÉM DA LAJE DA VARANDA DA FRENTE, FISCAL ESTEVE NA OBRA.												
	NA PRAÇA DOS ESPORTES, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE RAPAROS DAS 2 PISCINAS, ONDE ESTÃO SENDO SUBSTITUIDOS OS REVESTIMENTOS DANIFICADOS.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, HOJE INICIAMOS A COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS NO SEGUNDO PAVIMENTO, ESTAMOS FAZENDO OS REPAROS NO REBOCO NA PARTE INTERNA E TAMBÉM FAZENDO REPAROS DA REDE ELÉTRICA, E RETIRANDO OS VENTILADORES.												
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, ESTAMOS FAZENDO A PINTURA EXTERNA DO LOCAL, REPAROS NO REBOCO E CALÇADA, E FAZENDO O REPARO NO TELHADO DA COZINHA E BANHEIRO.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 04/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva				Dias restantes		
				X			Outros				Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, HOJE INICIAMOS A MANUTENÇÃO NO MURO LATERAL, ONDE FOI SOLICITADO PARA SUBIR A ALVENARIA EM APROXIMADAMENTE 1 METRO DE ALTURA.												
	NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, ESTAMOS DESMONTANDO AS ULTIMAS DIVISÓRIAS PARA ENTREGA DO PRÉDIO.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, HOJE INICIAMOS A COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS NA PRAÇA DOS ESPORTES, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPARO DAS 2 PISCINAS, E JÁ INICIAMOS A IMPERMEABILIZAÇÃO DOS LOCAIS ONDE JÁ FOI RETIRADO OS REVESTIMENTOS DANIFICADOS.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE REBOCOS, FECHAMENTOS E OUTRAS IMPERFEIÇÕES DA ALVENARIA.												
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS TELHADOS, CALÇADAS E PAREDES. A PINTURA DA FACHADA TAMBÉM ESTA SENDO FEITA PELOS PINTORES.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 07/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):	
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva			Dias restantes	
X							Outros			Dias de atraso	
EFETIVO	Descrição		Qtd.	EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.	Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1								
	Arquiteto										
	Encarregado		1								
	Pedreiro		7								
	Servente		11								
	Guincheiro										
	Encanador		1								
	Marceneiro										
	Pintor		3								
	Eletricista		2								
	Telhadista		2								
Gesseiro											
Item	Discriminação das Atividades										
Serviços executados / Construtora	NA DELEGACIA CIVIL, HOJE INICIAMOS OS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DA VALETA QUE TEM ENTRE A DELEGACIA E A ANTIGA CADEIA, ONDE FOI SOLICITADO QUE FOSSE FEITA A DEMOLIÇÃO DA CANALETA E DO DEGRAL DE 30CM QUE TEM NO LOCAL.										
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ESTAMOS FECHANDO UMA PORTA NA ENTRADA PRINCIPAL COM ALVENARIA.										
	NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NO MURO LATERAL, QUE FOI SOLICITADO PARA SUBIR CERTA DE 1 METRO.										
	NA PRAÇA DOS ESPORTES, ESTAMOS CONTINUANDO OS SERVIÇOS DE REPARO INTERNOS DAS 2 PISCINAS.										
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONTINUA OS REPAROS NA CALÇADA, REPAROS DE PINTURA GERAL E TAMBÉM NO TELHADO DO BANHEIRO E COZINHA.										

Ass. Responsável

Visto Fiscalização

NATALIA SILVA
COSTA:08940944674

Assinado digitalmente por NATALIA SILVA
COSTA:08940944674
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=EM
BRAND; OU=21545437000180; OU=presencial_CN
=NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Ely sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.12 09:16:52-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

44674

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/09/2023 14:23 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/tp64f4cff797c4>.



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS OBJETOS: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 08/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):	
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva				Dias restantes
	X						Outros				Dias de atraso
EFETIVO	Descrição		Qtd.	EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.	Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1								
	Arquiteto										
	Encarregado		1								
	Pedreiro		7								
	Servente		11								
	Guincheiro										
	Encanador		1								
	Marceneiro										
	Pintor		3								
	Eletricista		2								
	Telhadista		2								
Gesseiro											
Item	Discriminação das Atividades										
Serviços executados / Construtora	NA PRAÇA DOS ESPORTES, ESTAMOS DANDO SEGUENCIA AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS DUAS PISCINAS. ESTÁ SENDO FEITO REPAROS NO REVESTIMENTO INTERNO DAS PISCINAS. ESTAMOS UTILIZANDO VEDATOP, UM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA ÁREAS MOLHADAS, ANTES DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO.										
	NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, A EQUIPE ESTANDO FINALIZANDO A EXECUÇÃO DO MURO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, HOJE INICIAMOS A COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE SUSTENTAÇÃO TAMBÉM ALMENTADO EM 1,2 METROS, ACOMPANHANDO O MURO.										
	NA DELEGACIA CIVIL, ESTAMOS DEMOLINDO A CANALETA DA DIVISA DA DELEGACIA CIVIL E A ANTIGA CADEIA. FOI FEITA A REMOÇÃO DE UM DEGRAL DE APROXIMADAMENTE 50 CM DE ALTURA, QUE SEGUIA AO LONGO DO MURO.										
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ESTAMOS FECHANDO A ALVENARIA DA PORTA DA FRENTE CONFORME SOLICITADO. FOI FEITA A REMOÇÃO DA PORTA, FECHAMENTO DA ALVENARIA E TAMBÉM O REBOCO DA NOVA ALVENARIA.										
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, HOJE ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REPAROS DA CALÇADA E TAMBÉM NO TELHADO.										

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
 DATA INÍCIO: Abril/2023
 DATA TÉRMINO: Abril/2025
 CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS OBJETOS: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 09/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x		Dias restantes		
		X					Outros				Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	NA DELEGACIA CIVIL, CONTINUA OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA CANALETA E MURETA ENTRE A DELEGACIA E A ANTIGA CADEIA, FAZENDO RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS E CORTE DAS FERRAGENS.												
	NA PRAÇA DOS ESPORTES, ESTAMOS FAZENDO O NIVELAMENTO DA JUNTA DE DILATAÇÃO DA PISCINA PRINCIPAL, ONDE ESTA SENDO FEITO O TRATAMENTO COM IMPERMEABILIZANTE												
	NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, SEGUE COM A MANUTENÇÃO DO TELHADO E CALÇADA E TAMBÉM A PINTURA INTERNA E EXTERNA DE TODO O LOCAL.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINALIZAMOS O FECHAMENTO DA PORTA DA FRENTE, A EQUIPE DE ELÉTRICA REFEZ TODA A ELÉTRICA DA COZINHA NO PAVIMENTO TÉRREO. NO SEGUNDO PAVIMENTO, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS.												
	NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, FINALIZOU O MURO LATERAL DO GALPÃO.												
	NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, A EQUIPE DE ELÉTRICA REALIZOU A TROCA DE 45 LÂMPADAS QUE ESTAVAM QUEIMADAS.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 10/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva				Dias restantes		
			X				Outros				Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	NA DELEGACIA CIVIL, ESTAMOS DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA CALANETA E DA MURETA E TAMBÉM A RETIRADA DA FERRAGEM.												
	NA PRAÇA DOS ESPORTES ESTAMOS FAZENDO O CORTE DA JUNTA DE DILATAÇÃO NA PISCINA PRINCIPAL, FAZENDO TODA A LIMPEZA INTERNA E A REMOÇÃO DO ENTULHO.												
	NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, HOJE INICIAMOS A COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DA DIVISÓRIAS NO 1º PAVIMENTO. A EQUIPE ELÉTRICA TAMBÉM FOI ACIONADA PARA A COLOCAÇÃO DA TOMADA NA SALA NO 1º PAVIMENTO.												
	NO BAIRRO PANTANO, HOJE RETORNAMOS OS SERVIÇOS NA FONTE. ONDE ESTAMOS IMPERMEABILIZANDO O FUNDO E LATERAL DA FONTE E TAMBÉM COLOCANDO A INFRA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO.												
	O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONTINUA OS SERVIÇOS NO TELHADO E TAMBÉM OS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 11/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):	
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva			Dias restantes	
				X			Outros			Dias de atraso	
EFETIVO	Descrição		Qtd.	EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.	Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1								
	Arquiteto										
	Encarregado		1								
	Pedreiro		7								
	Servente		11								
	Guincheiro										
	Encanador		1								
	Marceneiro										
	Pintor		3								
	Eletricista		2								
Telhadista		2									
Gesseiro											
Item	Discriminação das Atividades										
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil, a equipe encerrou as atividades de demolição e está preenchendo a canaleta com tijolo. Foi iniciada a atividade de colocação do eletroduto no muro da delegacia.									
	2	Na Praça de Esportes, os serviços na piscina continuam com a execução da junta de dilatação e impermeabilização nos pontos onde retiraram os azulejos.									
	3	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.									
	4	No Bairro Pantano foi iniciada a colocação do revestimento na fonte.									
	5	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e o telhado continua sendo reformado.									
	6	Na Secretaria de Trânsito foi feito um reparo no cano que liga a caixa d'agua ao sistema de distribuição do prédio, o mesmo estourou.									
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza e na Delegacia verificando os trabalhos.									

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 14/08/2023								Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x			Dias restantes		
X							Outros					Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.		
	Engenheiro		1											
	Arquiteto													
	Encarregado		1											
	Pedreiro		7											
	Servente		11											
	Guincheiro													
	Encanador		1											
	Marceneiro													
	Pintor		3											
	Eletricista		2											
	Telhadista		2											
Gesseiro														
Item	Discriminação das Atividades													
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil, deram início a atividade de concretagem na canaleta. Continua a atividade de colocação do eletroduto no muro da delegacia.												
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e o telhado continua sendo reformado.												
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos												
	4	Na Central de Atendimento foi feita a desmontagem de alguns cabearmentos e divisórias												
	5	No Mercado Municipal iniciou a colocação de revestimento na parede do banheiro masculino.												
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza e no Mercado Municipal verificando os trabalhos.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização

NATALIA SILVA
COSTA:0894094467

Assinado digitalmente por NATALIA SILVA COSTA:08940944674
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=2156437000180, OU=presencial, CN=NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.12 09:20:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
 CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
 DATA INÍCIO: Abril/2023
 DATA TÉRMINO: Abril/2025
 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 15/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):					
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação				
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva				Dias restantes				
	X						Outros				Dias de atraso				
EFETIVO	Descrição		Qtd.				EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1												
	Arquiteto														
	Encarregado		1												
	Pedreiro		7												
	Servente		11												
	Guincheiro														
	Encanador		1												
	Marceneiro														
	Pintor		3												
	Eletricista		2												
	Telhadista		2												
Gesseiro															
Item	Discriminação das Atividades														
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil está em andamento a atividade de concretagem da canaleta. Continua a atividade de colocação do eletroduto no muro da delegacia.													
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e o telhado continua sendo reformado.													
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos													
	4	No Mercado Municipal continua com a colocação de revestimento na parede do banheiro masculino.													
	5	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.													
	6	Na Prefeitura Municipal foram realizadas a troca de 5 lâmpadas no gabinete do prefeito, execução de canaletas e tomadas na sala de comunicação além da manutenção da fechadura da porta.													
	7	Na Procuradoria Geral do Município foi executado a troca de uma curva na pia do banheiro.													
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, no Pantâno e na Secretaria da Administração verificando os trabalhos.													

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023
DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 16/08/2023							Condições do Tempo				Prazo contratual (meses):		
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva				Dias restantes		
		X					Outros				Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil está em andamento a atividade de concretagem da canaleta. Continua a atividade de colocação do eletroduto no muro da delegacia.											
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e o telhado continua sendo reformado.											
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos											
	4	No Mercado Municipal continua com a colocação de revestimento na parede do banheiro masculino.											
	5	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.											
	6	Na Prefeitura Municipal foi iniciada a impermeabilização das calhas e telhado e troca de um vidro da janela do Chefe de Gabinete.											
	7	Na Secretaria de Planejamento realizou o desentupimento de um vaso sanitário.											
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Delegacia e no Pantâno verificando os trabalhos.											

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 17/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):					
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação				
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x		Dias restantes				
			X				Outros				Dias de atraso				
EFETIVO	Descrição		Qtd.				EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1												
	Arquiteto														
	Encarregado		1												
	Pedreiro		7												
	Servente		11												
	Guincheiro														
	Encanador		1												
	Marceneiro														
	Pintor		3												
	Eletricista		2												
	Telhadista		2												
Gesseiro															
Item	Discriminação das Atividades														
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil finalizou a concretagem da canaleta e acabamento do muro. Também finalizou a atividade de colocação do eletroduto no muro da delegacia.													
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e finalizou a reforma do telhado.													
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos													
	4	No Mercado Municipal continua com a colocação de revestimento na parede do banheiro masculino e início do rejunte.													
	5	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.													
	6	Na Prefeitura Municipal continua o serviço de impermeabilização das calhas e telhado.													
	7	Na Praça de Esportes estão sendo realizadas melhorias de hidráulica e elétrica nos vestiários da piscina.													
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Praça de Esportes e no Pantâno verificando os trabalhos.													

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 18/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação	Dias restantes	
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva				Dias de atraso		
				X			Outros						
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
Telhadista		2											
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil iniciou a concretagem do antigo jardim da delegacia.											
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento.											
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos											
	4	No Mercado Municipal continua com a colocação de revestimento na parede do banheiro masculino e colocação do rejunte.											
	5	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.											
	6	Na Prefeitura Municipal finalizou o serviço de impermeabilização das calhas e telhado.											
	7	Na Praça de Esportes estão sendo realizadas melhorias de hidráulica e elétrica nos vestiários da piscina e iniciou a lavagem da piscina para colocação dos revestimentos faltantes.											
	O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Prefeitura e no Pantâno verificando os trabalhos.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 21/08/2023								Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x			Dias restantes		
X							Outros					Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.		
	Engenheiro		1											
	Arquiteto													
	Encarregado		1											
	Pedreiro		7											
	Servente		11											
	Guincheiro													
	Encanador		1											
	Marceneiro													
	Pintor		3											
	Eletricista		2											
Telhadista		2												
Gesseiro														
Item	Discriminação das Atividades													
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil continua a concretagem das áreas de jardim.												
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e alvenaria em alguns pontos quebrados.												
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos												
	4	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.												
	5	Na Prefeitura Municipal finalizou o serviço de impermeabilização das calhas e telhado.												
	6	Na Praça de Esportes estão sendo realizadas melhorias de hidráulica e elétrica nos vestiários da piscina, iniciou a colocação dos revestimentos faltantes e do rejunte.												
	7	No Mercado Municipal foi restaurado um ponto de elétrica no banheiro masculino.												
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza e no Pantâno verificando os trabalhos.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 22/08/2023								Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):		
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação	
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x		Dias restantes		
	X						Outros				Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
Telhadista		2											
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil continua a concretagem das áreas de jardim.											
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e finalizada a alvenaria em alguns pontos quebrados. Foi iniciada a concretagem do jardim.											
	3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos											
	4	Na Secretaria da Administração estão sendo executadas as divisórias no segundo pavimento.											
	5	Na Praça de Esportes estão sendo realizadas melhorias de hidráulica e elétrica nos vestiários da piscina e continua a colocação dos revestimentos faltantes e do rejunte. Também está sendo feita a lavagem do restante da piscina.											
	6	No Mercado Municipal continua o assentamento do revestimento na parede do banheiro masculino e colocação do rejunte.											
	O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Delegacia, no Mercado e no Pantâno verificando os trabalhos.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 23/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva			Dias restantes			
		X					Outros			Dias de atraso			
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
1	Na Delegacia Civil continua a concretagem das áreas de jardim.												
2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e finalizada a alvenaria em alguns pontos quebrados. Foi iniciada e finalizada a concretagem do jardim. Foi iniciada a reforma do banheiro externo masculino e alteração do local do tanque no estacionamento. Foi instalada uma porta na sala de sinalização.												
3	No Bairro Pantâno continua a aplicação dos revestimentos e início da aplicação do rejunte.												
4	Na Prefeitura foi instalada um vidro na divisória.												
5	Na Praça de Esportes continua a colocação dos revestimentos faltantes e do rejunte. Também foi finalizada a lavagem do restante da piscina.												
6	No Mercado Municipal foi finalizado o assentamento do revestimento na parede do banheiro masculino e colocação do rejunte.												
	O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, no Pantâno e na Praça de Esportes verificando os trabalhos.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 25/08/2023								Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x			Dias restantes		
				X			Outros					Dias de atraso		
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.		
	Engenheiro		1											
	Arquiteto													
	Encarregado		1											
	Pedreiro		7											
	Servente		11											
	Guincheiro													
	Encanador		1											
	Marceneiro													
	Pintor		3											
	Eletricista		2											
	Telhadista		2											
Gesseiro														
Item	Discriminação das Atividades													
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil continua a concretagem das áreas de jardim.												
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento. Está em andamento a reforma do banheiro externo masculino e alteração do local do tanque no estacionamento. Foi realizada a troca da caixinha de descarga na sala da junta militar.												
	3	No Bairro Pantâno finalizou a aplicação dos revestimentos e do rejunte.												
	4	Na Prefeitura foi iniciada a retirada as divisórias superiores da sala de RH para colocação de vidro.												
	5	Na Praça de Esportes continua a colocação dos revestimentos e do rejunte. Também foi realizada a retirada de um poste com a concretagem do local.												
	6	No Mercado Municipal foi finalizada a limpeza do local.												
	O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza e na Prefeitura verificando os trabalhos.													

Ass. Responsável

Visto Fiscalização

NATALIA
SILVA
COSTA:0894
0944674

Assinado digitalmente por NATALIA
SILVA COSTA:08940944674
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
21545437001910, OU=Presencial, CN=
NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.12 09:38:00-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/09/2023 14:23 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://ic.atende.net/tp64f4.cff797c4>.



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 28/08/2023								Condições do Tempo				Prazo contratual (meses):	
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação	
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x			Dias restantes	
X							Outros					Dias de atraso	
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	1	Na Delegacia Civil está em andamento a concretagem das áreas de jardim.											
	2	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento. Continua em andamento a reforma do banheiro externo masculino e foi finalizada a alteração do local do tanque no estacionamento.											
	3	No Praça de Esportes continua a aplicação dos revestimentos e aplicação do rejunte.											
	4	Na Prefeitura foi finalizada a retirada as divisórias superiores da sala de RH para colocação de vidro.											
	5	No Mercado Municipal foi instalado os acabamentos das válvulas hydra.											
	O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Delegacia e na Prefeitura verificando os trabalhos.												

Ass. Responsável

Visto Fiscalização

Assinado digitalmente por NATALIA SILVA
COSTA:08940944674
Nº: 0-00, OUCP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1: 0U=EM BRANCO), OU=
21545837000190, OU=presencial, CN=
NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.12 09:39:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/09/2023 14:23 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.ne/tp64ff4.cff797c4>.



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 29/08/2023								Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):				
Dia da Semana								Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação			
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva	x	x			Dias restantes			
	X						Outros					Dias de atraso			
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.			
	Engenheiro		1												
	Arquiteto														
	Encarregado		1												
	Pedreiro		7												
	Servente		11												
	Guincheiro														
	Encanador		1												
	Marceneiro														
	Pintor		3												
	Eletricista		2												
Telhadista		2													
Gesseiro															
Item	Discriminação das Atividades														
Serviços executados / Construtora	1	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e também a reforma do banheiro externo masculino.													
	2	Na Praça de Esportes continua a colocação dos revestimentos e do rejunte.													
	3	Na Secretaria da Administração continua a instalação das divisórias no segundo pavimento.													
	4	Na Prefeitura estão sendo instaladas portas no gabinete do prefeito.													
	5	Na Delegacia Civil foi finalizada a concretagem das áreas de jardim.													
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Delegacia e na Prefeitura verificando os trabalhos.													

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 30/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):					
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação				
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva			Dias restantes					
		X					Outros			Dias de atraso					
EFETIVO	Descrição		Qtd.				EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1												
	Arquiteto														
	Encarregado		1												
	Pedreiro		7												
	Servente		11												
	Guincheiro														
	Encanador		1												
	Marceneiro														
	Pintor		3												
	Eletricista		2												
	Telhadista		2												
Gesseiro															
Item	Discriminação das Atividades														
Serviços executados / Construtora	1	No Departamento de Limpeza as atividades de pintura continuam em andamento e também a reforma do banheiro externo masculino.													
	2	Na Praça de Esportes continua a colocação dos revestimentos e do rejunte.													
	3	Na Secretaria da Administração continua a instalação das divisórias no segundo pavimento.													
	4	Na Prefeitura continua em andamento as instalações das portas no gabinete do prefeito.													
	5	No Mercado Municipal foi iniciada a reforma do banheiro feminino.													
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Praça de Esportes e na Prefeitura verificando os trabalhos.													

Ass. Responsável

Visto Fiscalização



OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE
POUSO ALEGRE
CONTRATO 88/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023

DATA INÍCIO: Abril/2023
DATA TÉRMINO: Abril/2025

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS
OBJETO: EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

Data: 31/08/2023							Condições do Tempo			Prazo contratual (meses):			
Dia da Semana							Bom	Manhã	Tarde	Noite	Prorrogação		
2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sáb	Dom	Chuva			Dias restantes			
			X				Outros			Dias de atraso			
EFETIVO	Descrição		Qtd.		EQUIPAMENTOS	Descrição		Qtd.		Descrição		Qtd.	
	Engenheiro		1										
	Arquiteto												
	Encarregado		1										
	Pedreiro		7										
	Servente		11										
	Guincheiro												
	Encanador		1										
	Marceneiro												
	Pintor		3										
	Eletricista		2										
	Telhadista		2										
Gesseiro													
Item	Discriminação das Atividades												
Serviços executados / Construtora	1	No Departamento de Limpeza continua a reforma do banheiro externo masculino com início da aplicação do revestimento e a troca das bacias sanitárias. Foi realizado todo acabamento da parte elétrica da cozinha, hall e refeitório.											
	2	Na Praça de Esportes continua a colocação dos revestimentos e do rejunte.											
	3	Na Prefeitura continua em andamento a instalação das portas do gabinete do prefeito. Também está sendo feita a pintura e adequação da instalação elétrica da sala do prefeito.											
	4	No Mercado Municipal continua a reforma do banheiro feminino.											
	5	No Pantão a equipe voltou para adequação do acabamento das pastilhas da fonte e melhorias no rejunte. No local também está sendo realizado o acabamento do encanamento de saída de água da fonte.											
		O fiscal de obras esteve no Departamento de limpeza, na Praça de Esportes, no Pantão e na Prefeitura verificando os trabalhos.											

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/09/2023 14:23 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/tp64f4.cff797c4>



Assinado eletronicamente por
Ass. Responsável
GERSON LUIZ DO
NASCIMENTO
JUNIOR:30232946825
302.329.468-25
ENGENHEIRO(A) FISCAL

Visto Fiscalização


NATALIA
SILVA
COSTA:08940
944674

Assinado digitalmente por NATALIA
SILVA COSTA:08940944674
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
215456700100, OU=presencial, CN=
NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.12 09:48:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0




ORDEM DE SERVIÇO	Nº 39
Da: Secretaria de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos.	Data: 01/09/2023
Para: J Costa Engenharia e Construção LTDA	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÃO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODO O MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
Local do serviço: DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	
Endereço do local: MONSENHOR JOSÉ PAULINO Nº464 – SANTA CRUZ	
Conforme Contrato nº 88/2023, pregão eletrônico 12/2023, encaminho a presente ordem de serviço para manutenção predial.	
Descrição dos serviços: 1. MANUTENÇÃO DE ALVENÁRIA 2. MANUTENÇÃO DE COBERTURA 3. ESQUADRIA 4. MANUTENÇÃO HIDRAULICA	
<p>AUGUSTO HART FERREIRA:0382159685 Assinado digitalmente por AUGUSTO HART FERREIRA:0382159685 ND: C=BR; O=CP-Brasil; OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A3; OU=EM BRANCO; OU=1545437000180; OU=representacional; CN=AUGUSTO HART FERREIRA:0382159685 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Fossil PDF Reader Versão: 12.0.1</p> <p>Augusto Hart Ferreira Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.</p>	

_____/_____/_____
NATALIA SILVA
COSTA:08940944674
Assinado digitalmente por NATALIA SILVA
COSTA:08940944674
ND: C=BR; O=CP-Brasil; OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e CPF A1; OU=EM BRANCO; OU=21545437000180; OU=representacional; CN=NATALIA SILVA COSTA:08940944674
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.18 14:25:10-03'07
Fossil PDF Reader Versão: 12.1.0

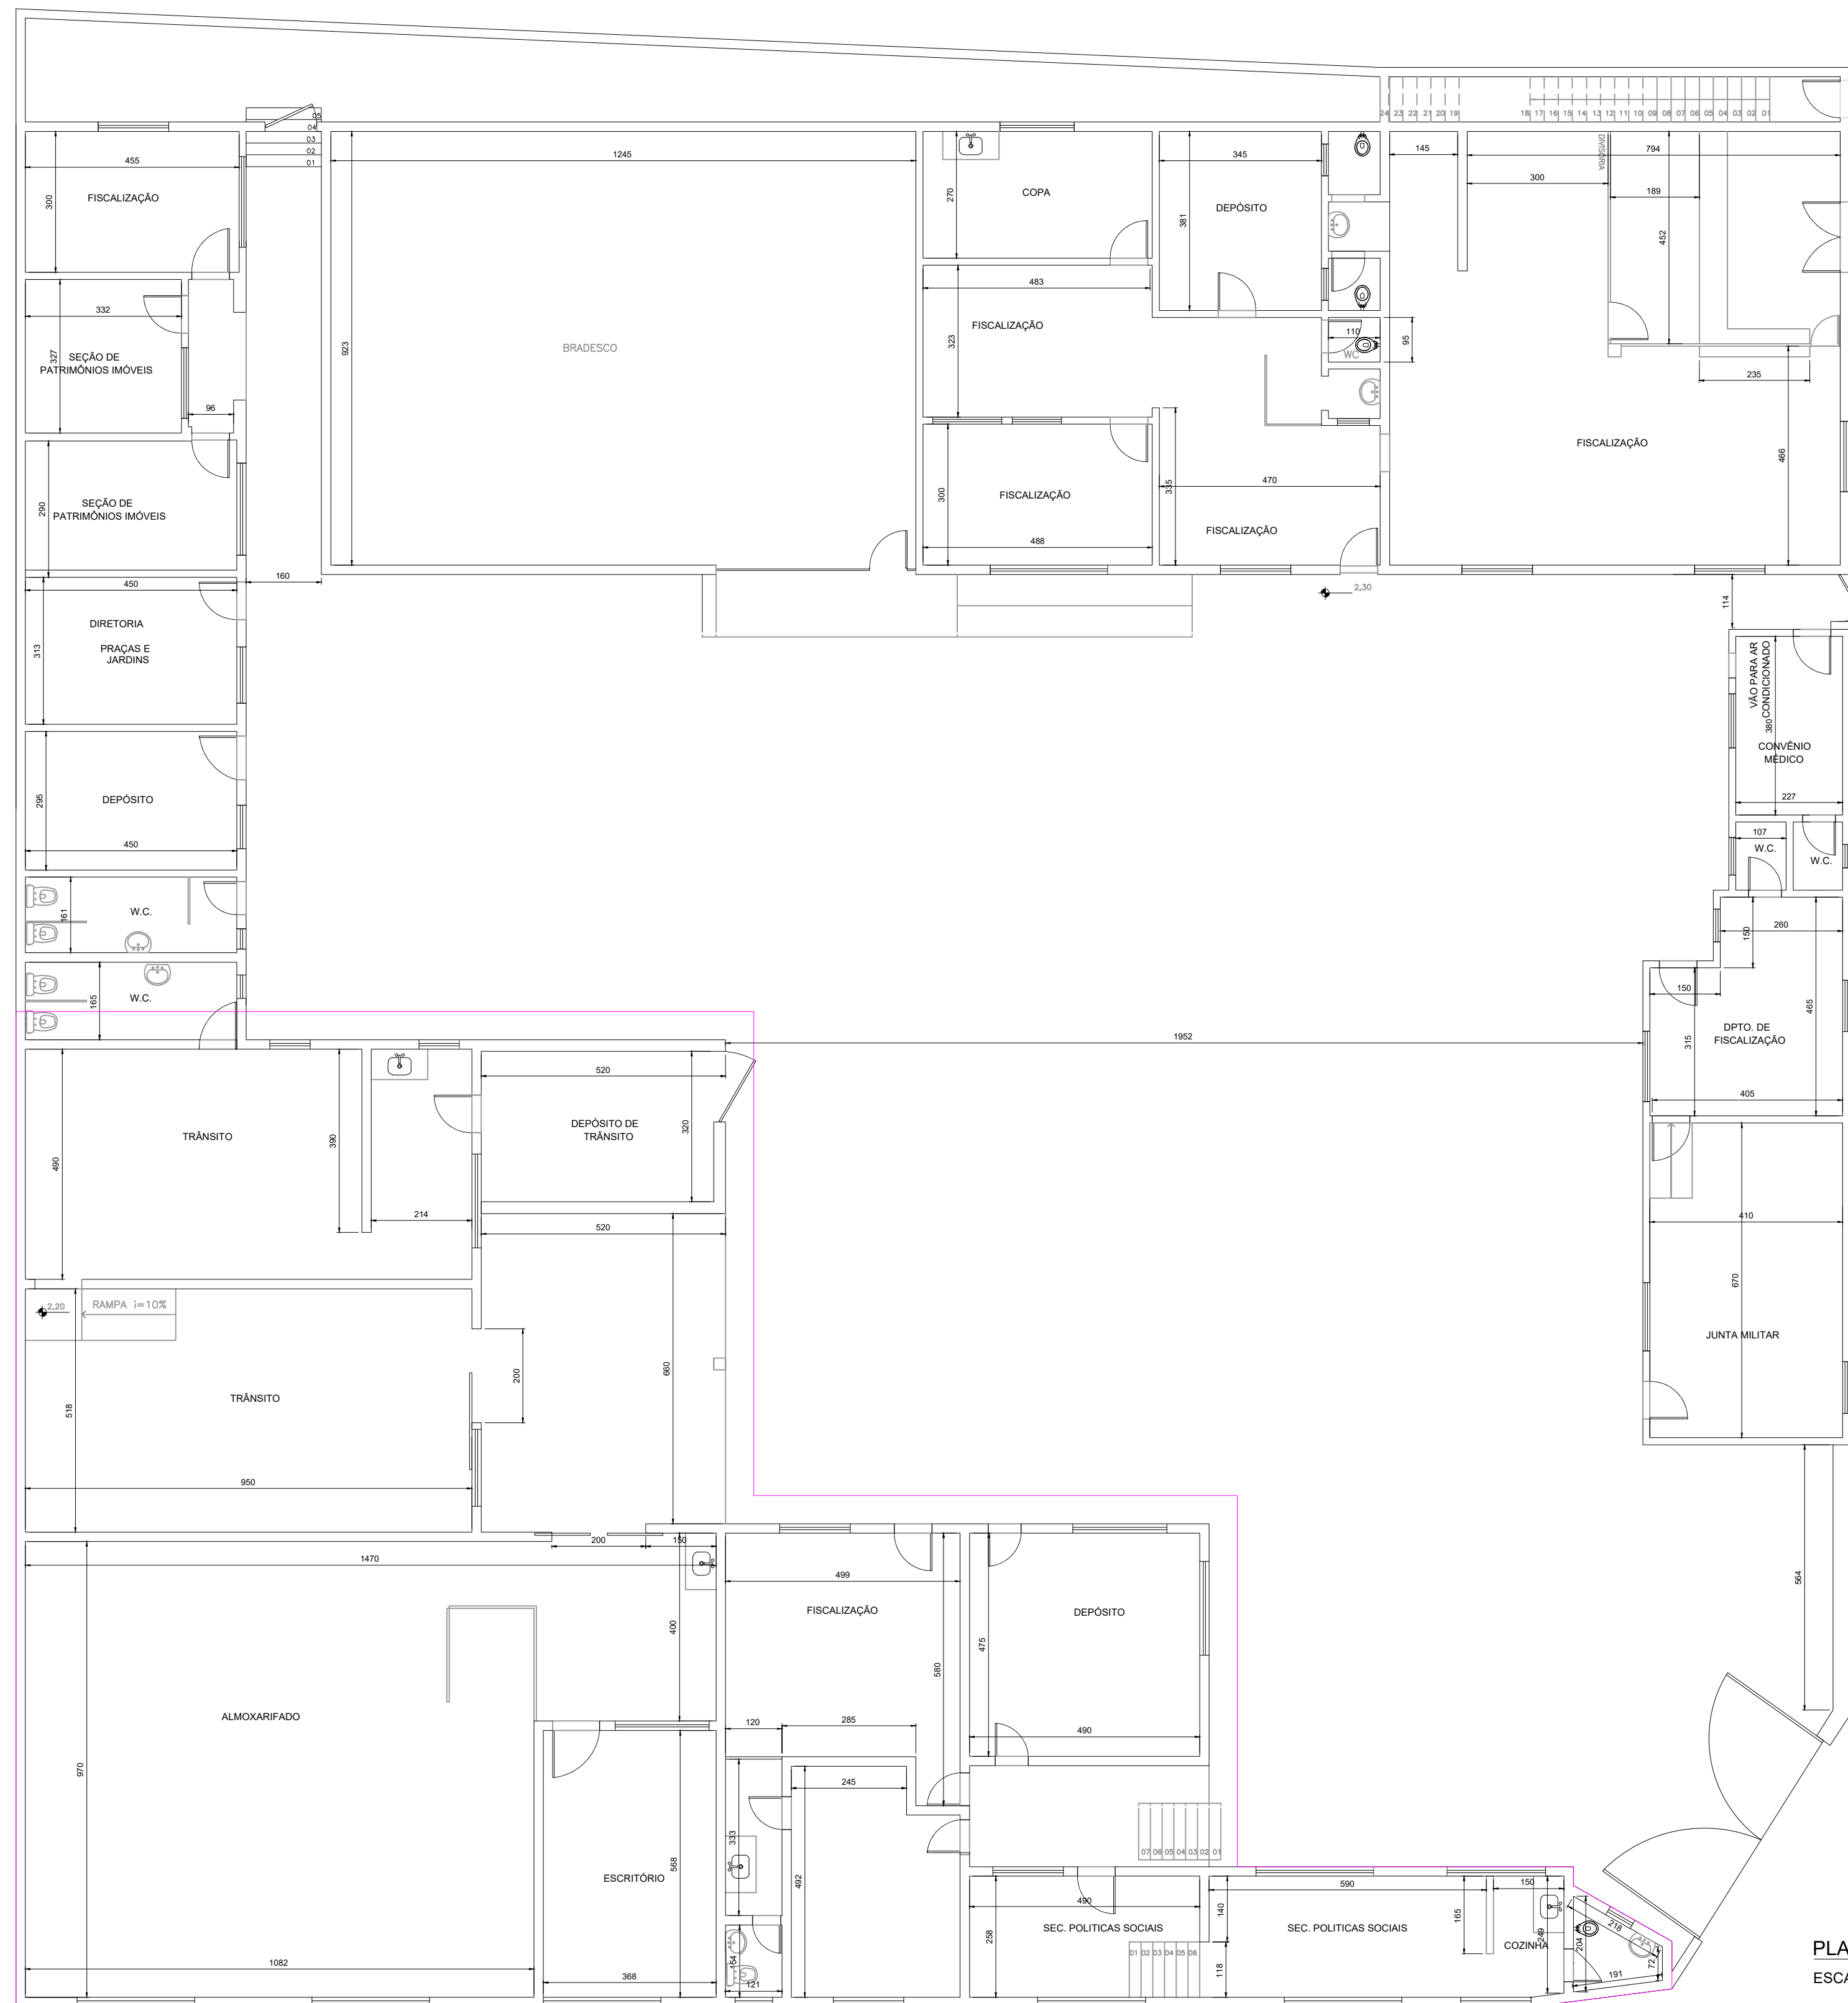

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

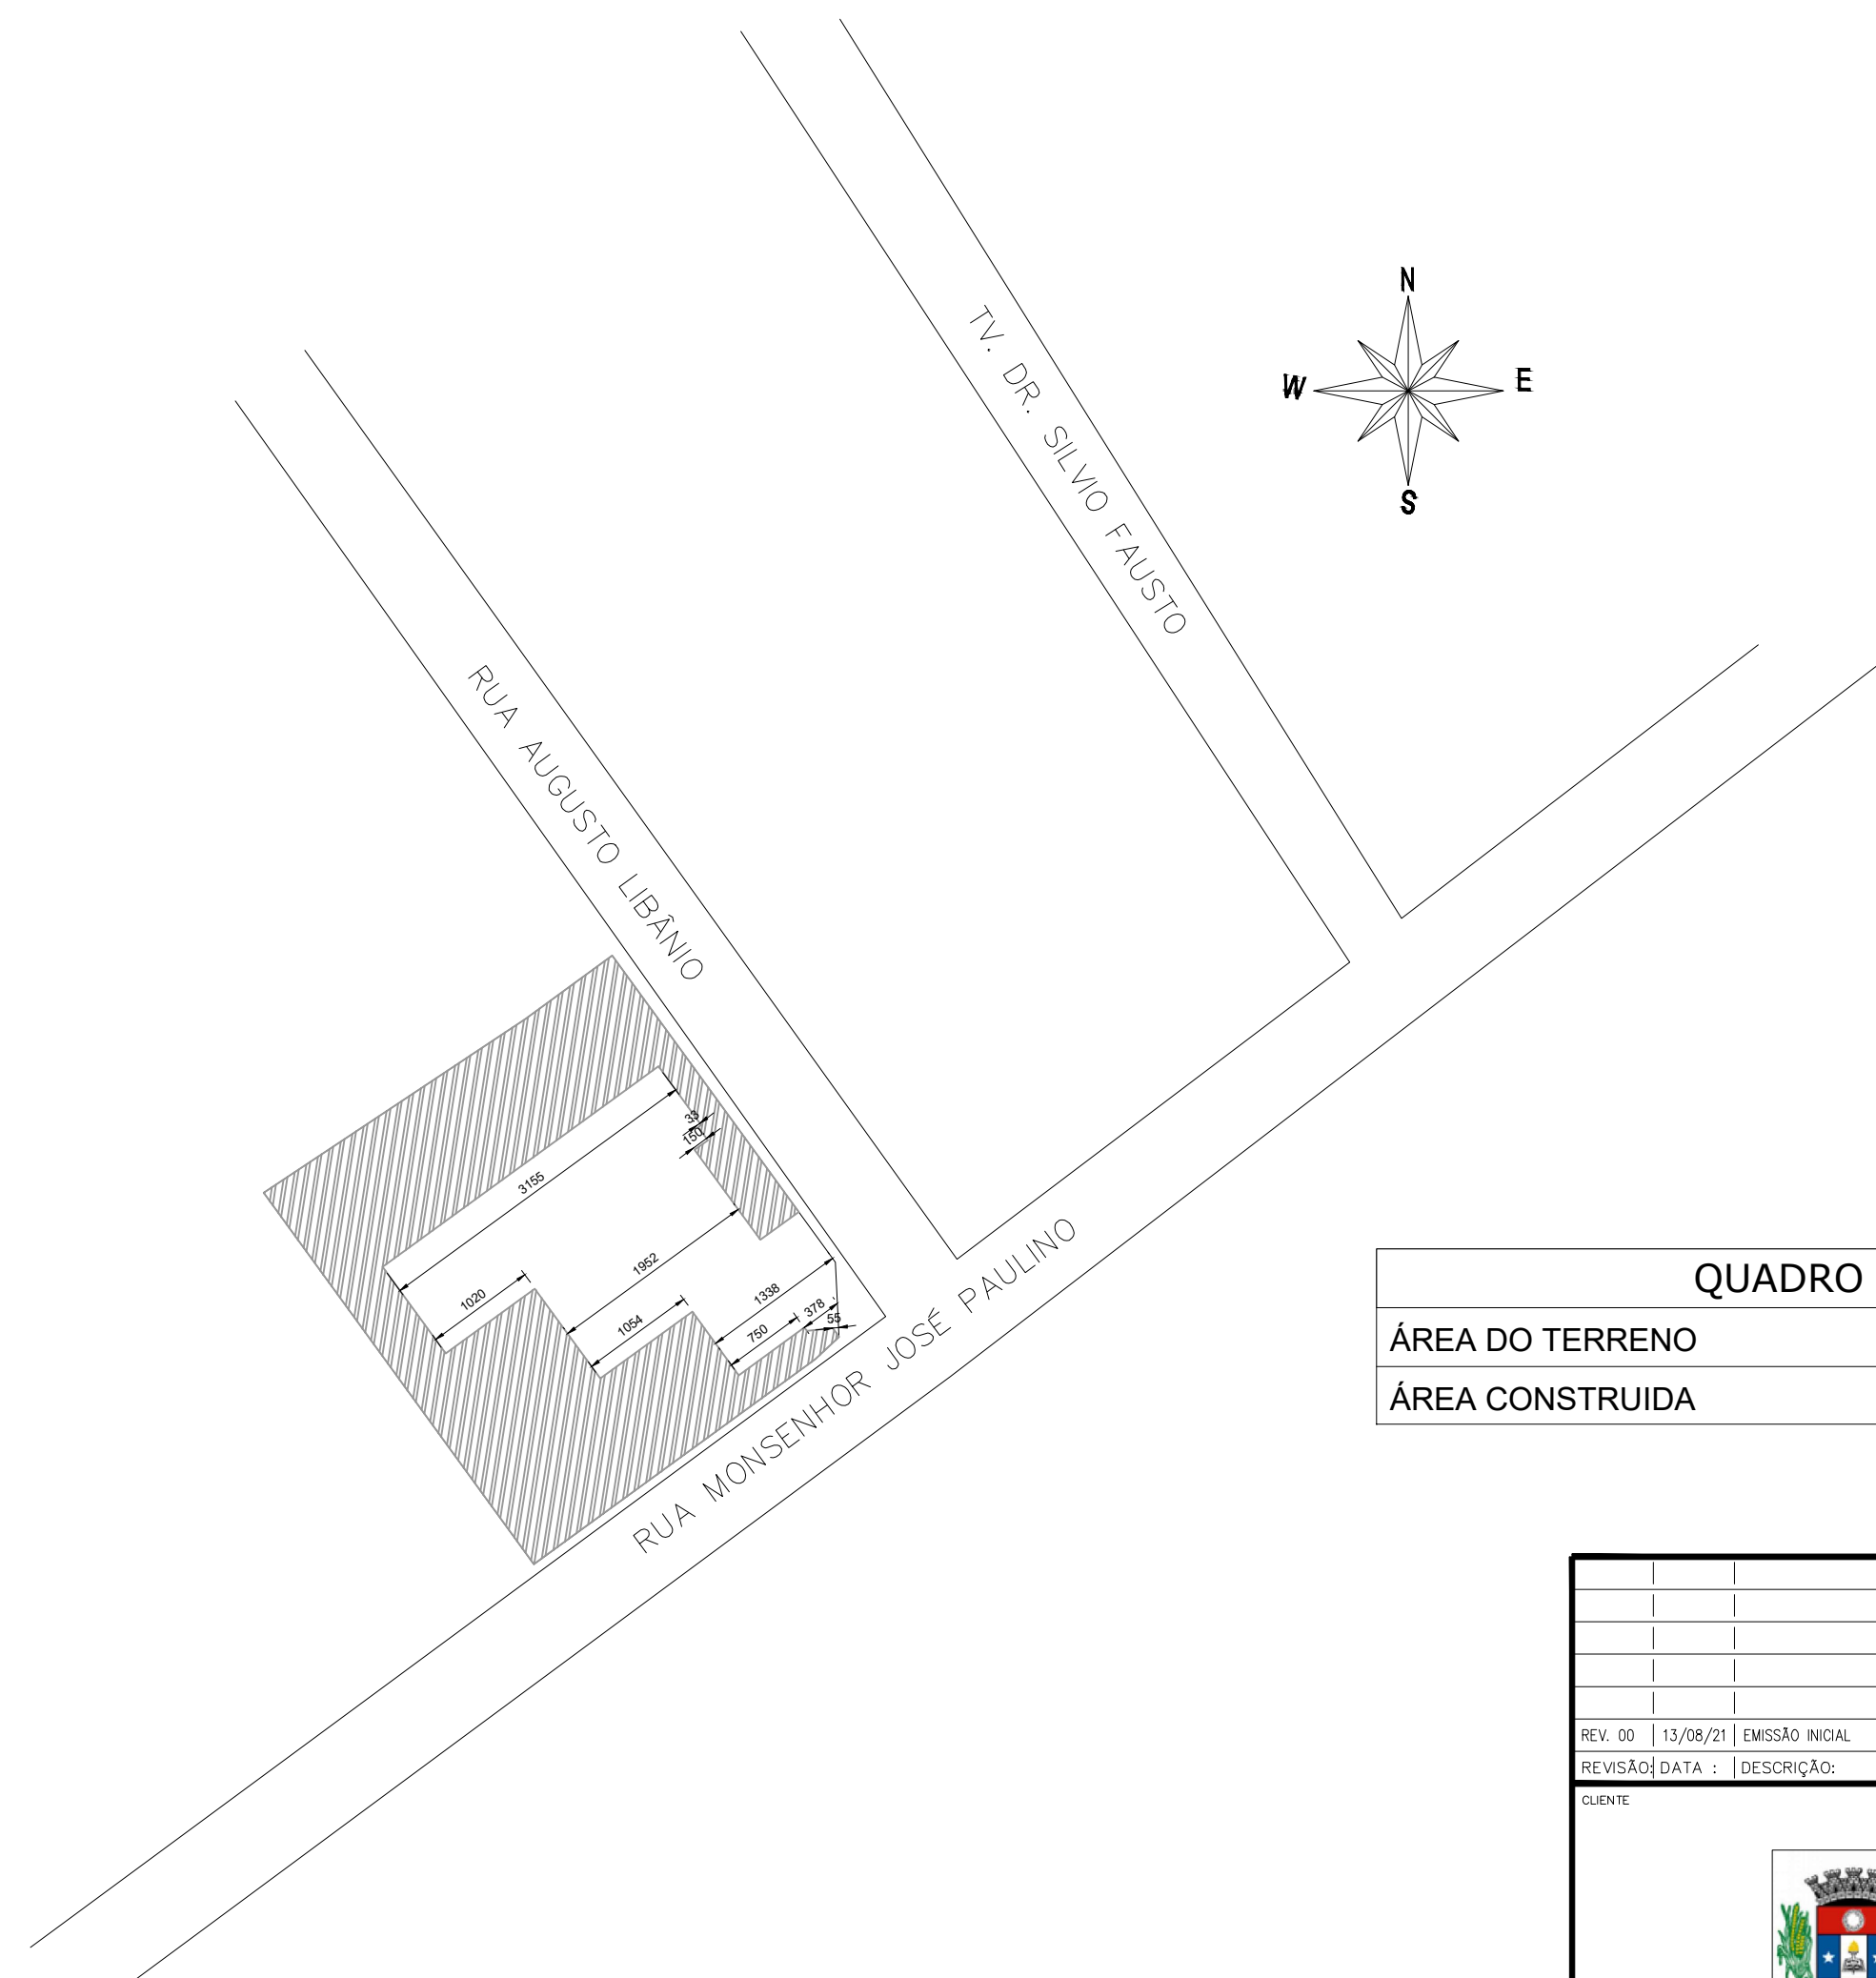

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:500

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	1.615,47 M ²
ÁREA CONSTRUÍDA	1.005,75 M ²

			
<p>REV. 00 13/08/21 EMISSÃO INICIAL DAC</p> <p>REVISÃO DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:</p>			
<p>CLIENTE</p>			
<p>PROJETO</p>			
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS BIANCA BARUK NOGUEIRA ROSA</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGR. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO FLÁVIA CRISTINA BARBOSA</p> <p>DESENHO WILIAN TÓBIAS GUEDES</p>			
<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>DEP. LIMPEZA/JUNTA MILITAR/ALMOXARIFADO</p>			
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA MONSENHOR JOSÉ PAULINO, 464, BAIRRO SANTA CRUZ POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>			
<p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PLANTA BAIXA, IMPLANTAÇÃO E TABELAS</p>			
<p>DISCIPLINA</p> <p>ARQUITETÔNICO</p> <p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p> <p>FOLHA Nº.</p> <p>ÚNICA</p>			
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ANEXO
13/08/2021	INDICADA	ROO	DEP.LIMPEZA-JUNTA MILITAR-ALMOXARIFADO.DWG
